



**Управления городского хозяйства и промышленного комплекса
Администрации муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области**



Проект:

**«Оптимизация процесса предоставления услуги предварительного
согласования предоставления земельного участка»**

Команда проекта



Руководитель проекта:

Федоренков А.В.

Заместитель Главы муниципального образования - начальник Управления по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Члены рабочей группы:



Кокурина М.В.

Начальник отдела строительства и ремонтов



Карпикова Е.Г.

специалист 1 категории

Карточка проекта



Карточка проекта

"Оптимизация процесса предоставления услуги предварительного согласования предоставления земельного участка".



Согласовано:

Заместитель Главы муниципального образования - начальник Управления ГХ и ПК Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Федоренков А.В.

Дата, подпись, ФИО

Утверждаю:

Глава муниципального образования "город Десногорск"

Терлецкий А.А.

Дата, подпись, ФИО

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора		
Заказчик процесса: Глава муниципального образования "город Десногорск" Терлецкий А.А.			Ключевой риск: Неудовлетворенность заявителей сроками предоставления услуги		
Владелец процесса: Зам. Главы Федоренков А.В.			Проблемы: Отказ заявителей от электронной подачи заявлений в администрацию через гос.услуги		
Периметр проекта: Управление ГХ и ПК г. Десногорска, Юридический отдел, Управление ИиЗО г. Десногорска, Аппарат администрации					
Границы процесса: от подачи заявления до регистрации постановления Администрации МО г. Десногорска					
Руководитель проекта: Зам. Главы Федоренков А.В.					
Команда проекта: Начальник отдела строительства и ремонтов М.В. Кокурина, специалист 1 категории Е.Г. Карликова					
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование показателей	Текущий показатель*	Целевой показатель**	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени предоставления услуги	20 дн.	12 дн.	1. Старт проекта		12.01.2026
			2. Диагностика и целевое состояние	13.01.2026	19.03.2026
			• Разработка текущей карты процесса	13.01.2026	27.01.2026
			• Анализ проблем и потерь	27.01.2026	10.02.2026
			• Разработка идеальной и целевой карты процесса	11.02.2026	25.02.2026
			• Разработка плана мероприятий	26.02.2026	12.03.2026
			3. Kick-off. Защита плана мероприятий перед заказчиком		19.03.2026
			4. Внедрение улучшений	20.03.2026	19.05.2026
			5. Мониторинг результатов	10.04.2026	24.04.2026
			6. Закрытие проекта		26.05.2026
			7. Закрепление результатов	19.05.2026	18.06.2026
Дополнительные эффекты:					

Руководитель проекта:

Федоренков А.В.

Подпись, ФИО, дата

Целевые показатели




	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение ВПП, дни	20	12

Карта текущего состояния процесса



"Оптимизация процесса предварительного согласования земельного участка"

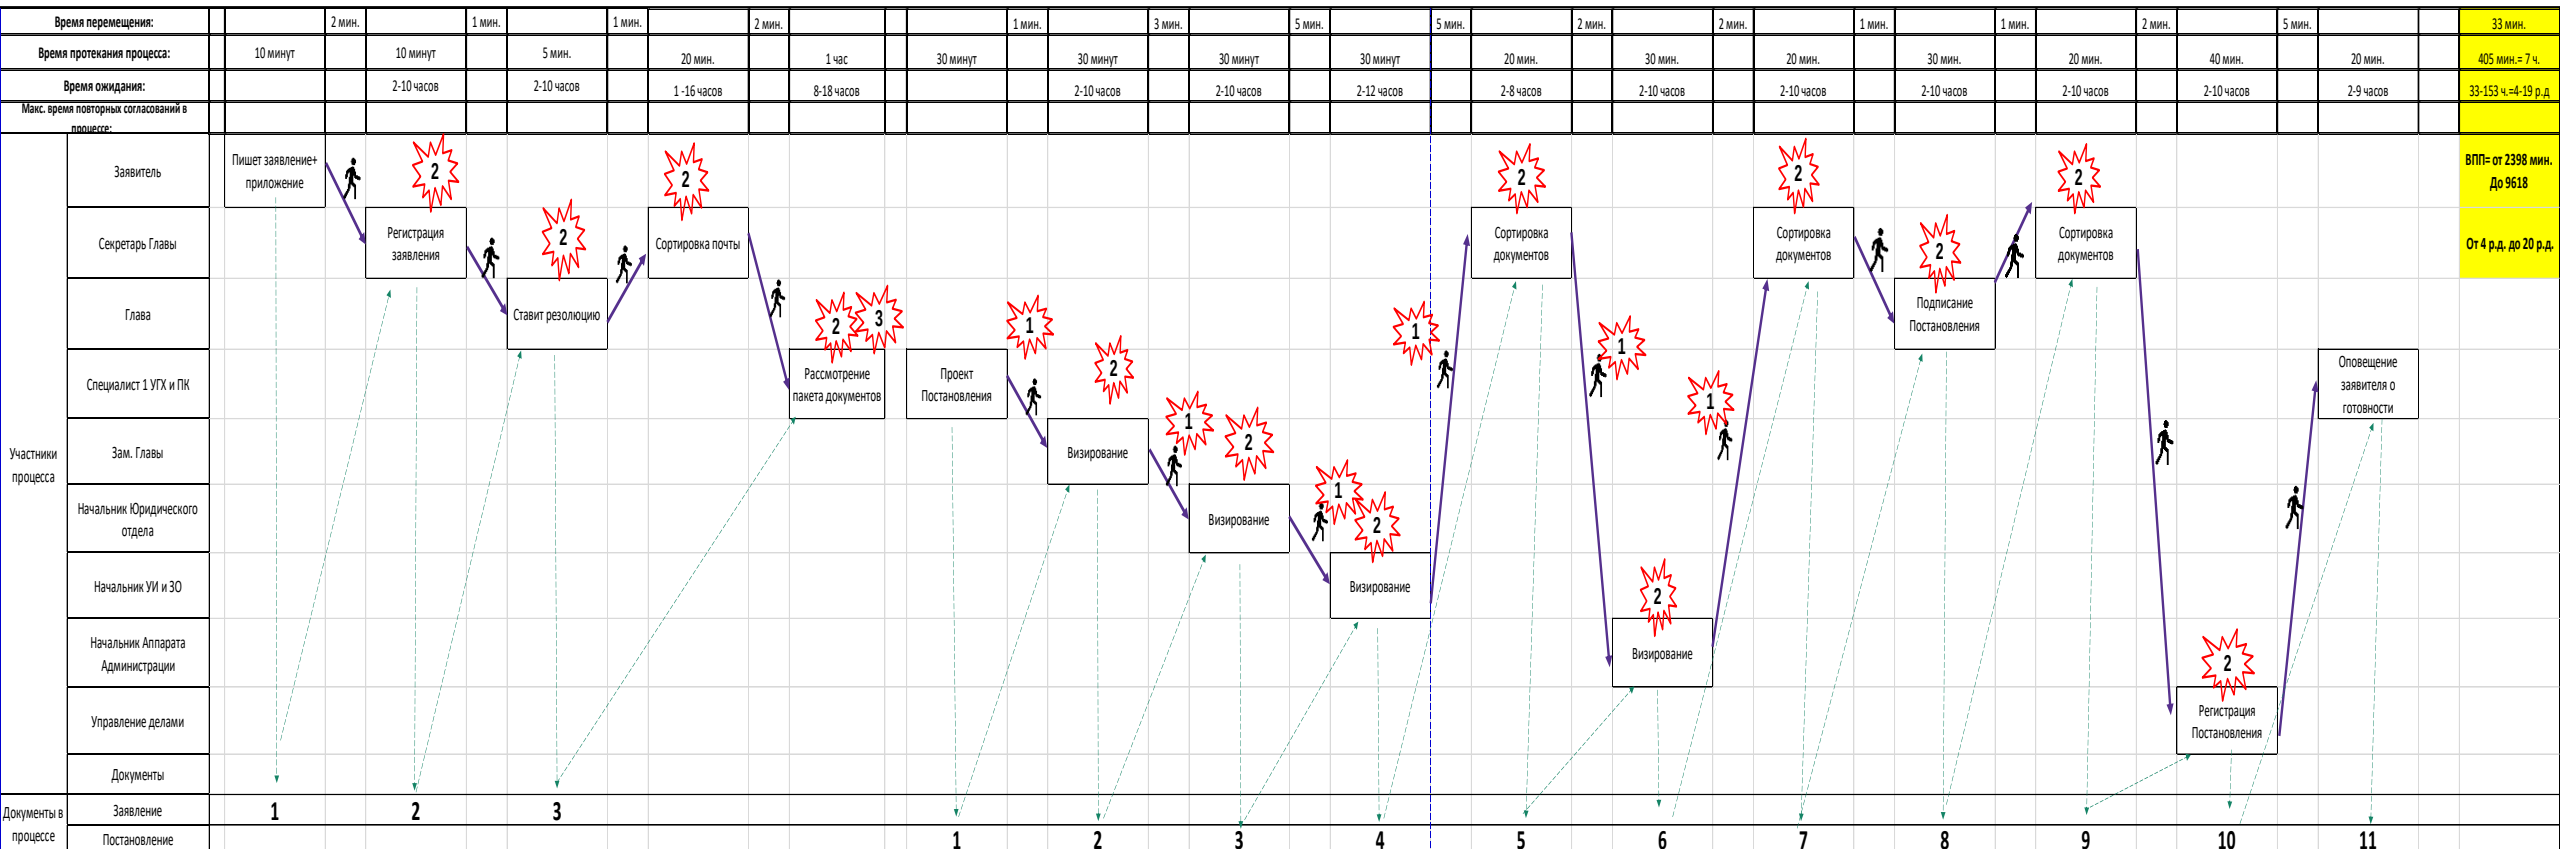

ВПП = до 20 раб. дн.


Выявленные проблемы

- Перемещение документов вручную
- Ожидание регистрации заявления
- Запрос дополнительной информации
- Последовательное согласование

Карта целевого состояния процесса



«Оптимизация процесса предварительного согласования земельного участка»

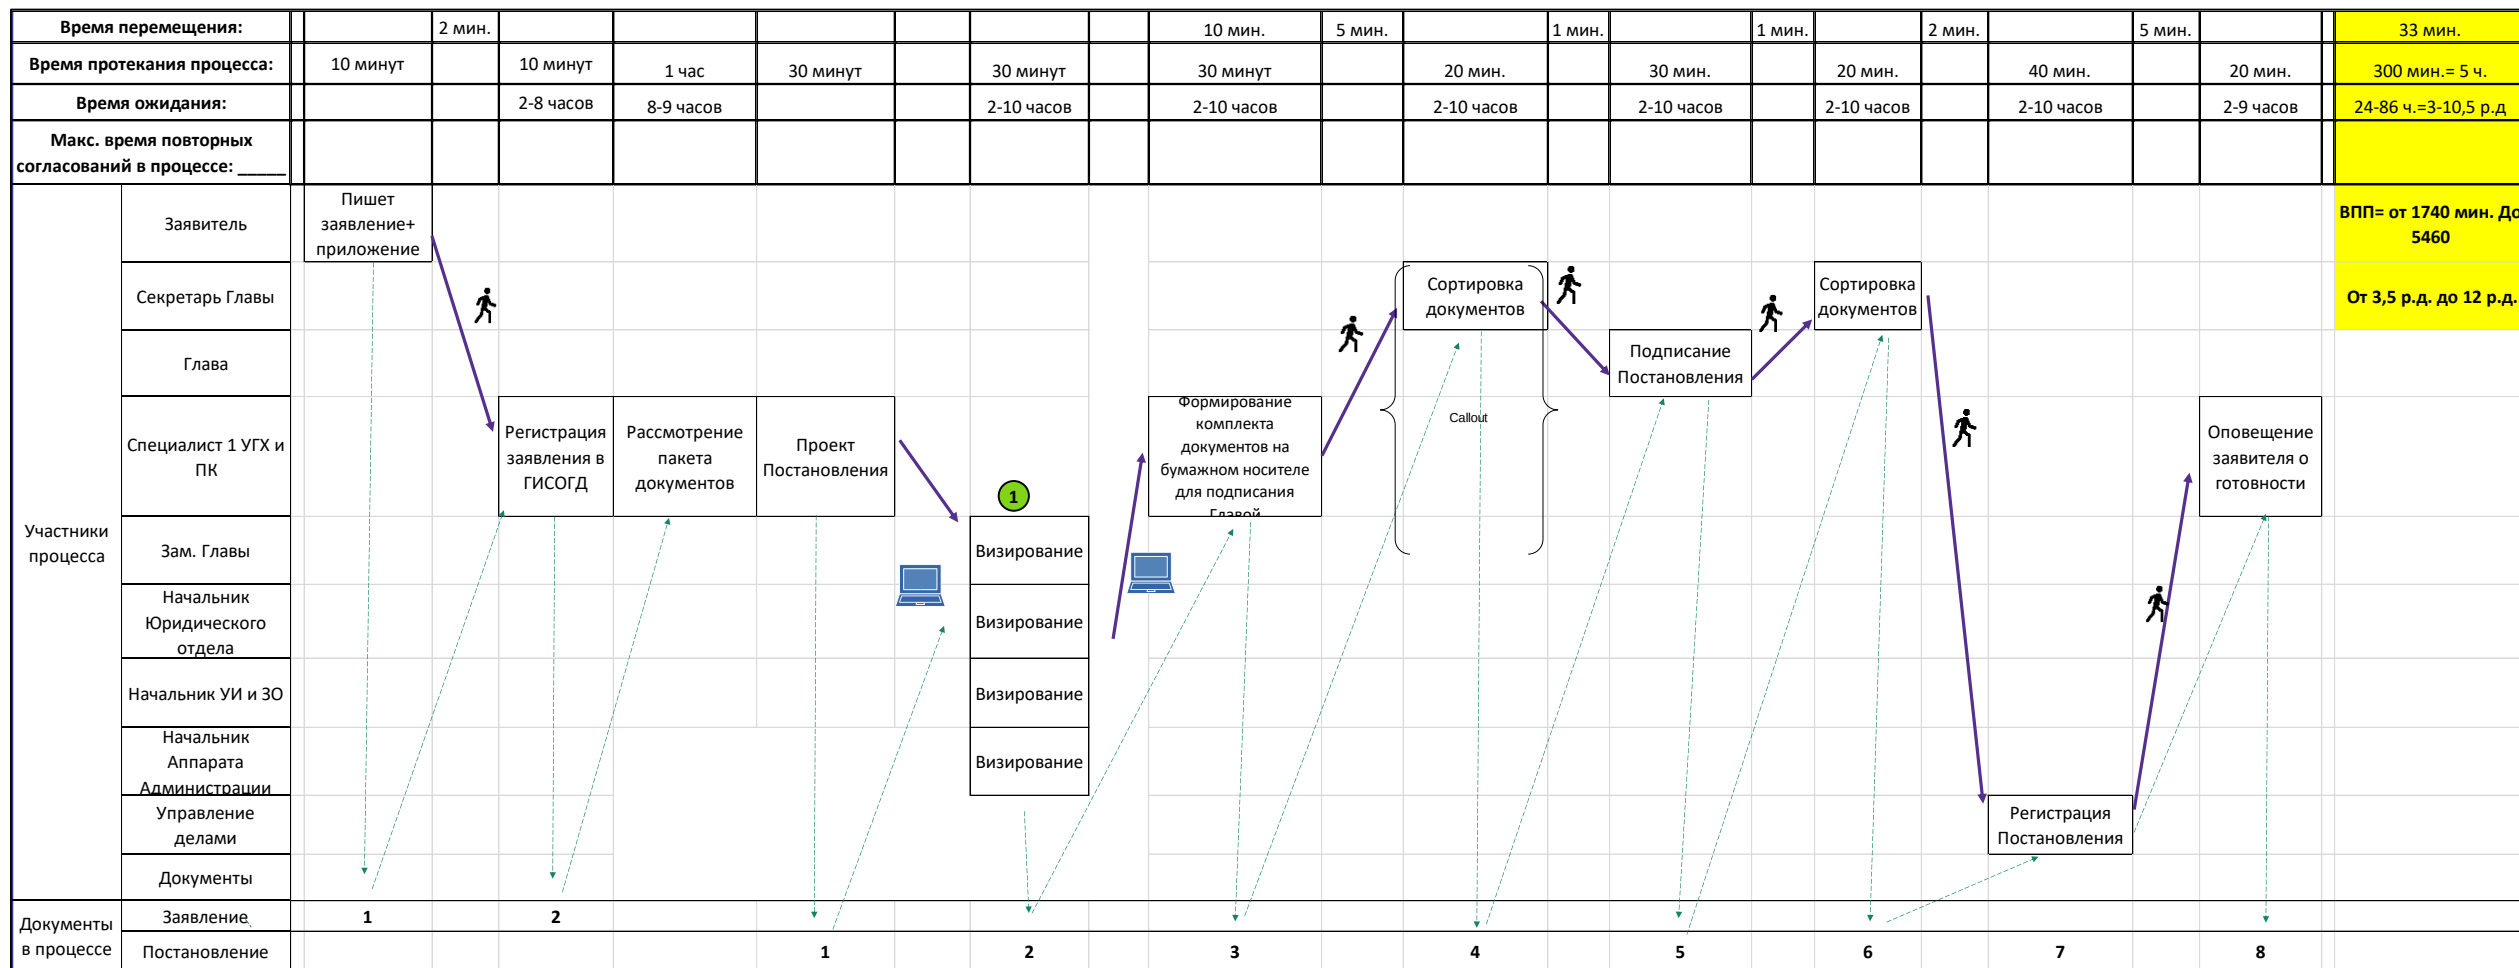

ВПП= до 12 раб. дней

Ключевые решения



- ✓ Регистрация заявление в Управлении ГХ и ПК через ГИСОГД (Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности)
- ✓ Параллельное согласование через СЭД
- ✓ Разработка памятки о необходимом пакете документов для предоставления услуги

План мероприятий по реализации проекта:

Проблема	Коренная причина	Мероприятие	Ответственный	Срок	Эффект	Затраты
1. Ожидание регистрации заявления	Необходима доработка НПА	Регистрация заявления в УГХиПК	Карпикова Е.Г.	Апрель 2026 г.	снижение ВПП на 2,5 р.д.	нет
2. Последовательное согласование	Необходима доработка НПА	Параллельное согласование через СЭД	Карпикова Е.Г.	Апрель 2026 г.	Снижение ВПП на 5 р.д.	нет
3. Запрос дополнительной информации	Низкая информированность населения	Разработка памятки о необходимом пакете документов для предоставления услуги	Карпикова Е.Г.	Апрель 2026 г.	Снижение ВПП на 1 р.д.	нет

Ожидаемые результаты



1. Сокращение времени предоставления услуги.
2. Обеспечение свободного информационного доступа для заявителя об оказании муниципальной услуги.
